Befundbericht
für elektrische Anlagen und Geräte

Auftraggeber	Auftraggeber Firma	**Auftragnehmer Nr.**	1234567190
Auftraggeber Nr.	2020-201003	**Ansprechpartner**	Müller
Baugruppe	Feuerlöschpumpe		
Einsatzort		Besprechungsraum	
Fertigungsstatus		Werkstatt	
Baugruppe	unvollständig		

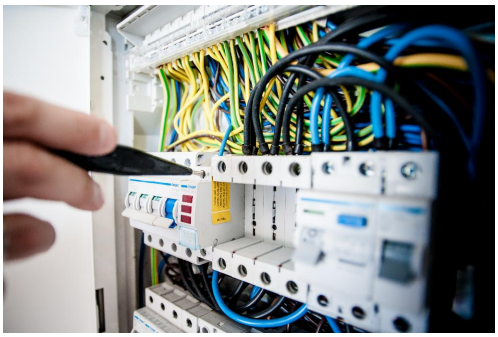

Befundbericht
für elektrische Anlagen und Geräte

Befund

Außenhülle stark korrodiert

Isolationsprüfung [MOhm]	2
Datum	20.08.2020
Ort	beim Kunden vor Ort

Instandsetzung

Beseitigung Korrosion, Erneuerung Verschleißteile

Geschätze Zeit [h]	4

Prüfung

Prüfung gemäß QS

Isolationsprüfung [MOhm]	3
nach Prüfgrundlage	DGUV
magn. Vermessung	Nein
Datum	20.08.2020
Ort	Werkstatt

Abnahme

Funktionsprüfung bei Anwesenheit des Kunden

Prüfer	Frau Prüfer
Datum	20.08.2020
Abnahme erfolgt	Ja
Messwert [MOhm]	24.6
